



AI-платформа управления подписками и регулярными платежами

Тестовое задание: Бизнес-аналитик + Project-менеджер
(платформа «Умный реестр подписок» · backend-ядро и AI-интеграция)

Выполнил: gibberie

МОСКВА
2026

Оглавление

Введение	3
1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам	4
2. Ключевой бизнес-процесс: напоминание и эскалация	5
3. Дорожная карта пилота (2 месяца)	7
4. Процесс работы с заказчиком и командой	8
5. Мотивация участия в проекте	8
Заключение	9
Список источников	10

Введение

Разработка любого программного продукта начинается не с кода, а с понимания задачи. Для платформы управления подписками и регулярными платежами это особенно важно: продукт работает с деньгами и персональными данными пользователя, а его ценность определяется одним измеримым обещанием — не допустить пропуска предстоящего списания. Поэтому настоящая работа посвящена не технической реализации, а бизнес-аналитической и управленческой проработке проекта — от сбора требований до плана двухмесячного пилота.

Специфика задачи в том, что данные о подписках сегодня разрознены: они рассыпаны по почте, банковским уведомлениям, заметкам и календарям, единого реестра не существует, а даты списаний пользователь отслеживает вручную. В результате нежелательные автопродления и просрочки выявляются постфактум, когда деньги уже списаны. Целевое состояние — единый реестр обязательств, который AI-агент наполняет автоматически: собирает финансовые события, извлекает из них сущности, приоритизирует напоминания и рекомендует пользователю действие — оплатить, отменить, продлить или проверить.

Ключевой принцип, проходящий через весь документ, — приоритет главной метрики: агент не должен пропускать предстоящие списания. Этот критерий задаёт логику поведения системы в спорных ситуациях и определяет как формулировку требований, так и критерии приёмки пилота. Всё остальное — модель данных реестра, статусы обязательств, вехи дорожной карты — подчинено этой главной цели.

Работа построена в пять разделов. В первом сформулированы вопросы к заказчику и стейкхолдерам, снимающие неопределённость в трёх плоскостях: бизнес-цель, источники данных и требования к их защите. Во втором подробно описан ключевой бизнес-процесс — напоминание о предстоящем списании и эскалация при отсутствии реакции — с текстовым сценарием и схемой потока со статусами. Третий раздел содержит дорожную карту двухмесячного пилота: шесть вех с критериями готовности, ролями и ключевыми рисками. Четвёртый описывает процесс работы с заказчиком и командой — форматы, частоту и фокус коммуникаций. Пятый посвящён мотивации участия в проекте. Завершают работу заключение и список использованных источников.

Такая структура отражает главный принцип грамотного анализа: каждое проектное решение — вопрос, процесс, веха плана — принимается не само по себе, а ради управляемого снижения проектного риска и достижения измеримого результата, значимого для пользователя.

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Девять вопросов, которые я задам в первую очередь. Для каждого указано кому адресован, зачем нужен ответ и какой риск закрывает.

№	Кому	Вопрос	Зачем / какой риск закрываем
1	Заказчик	Какая бизнес-цель первична для пилота: экономия пользователя, удержание в экосистеме или сбор данных о расходах?	Зачем: определяет главную метрику успеха и приоритеты бэклога Риск: разработку «всего сразу» без измеримого результата
2	Заказчик	Каков ожидаемый масштаб пилота (пользователи, объём писем/мес) и бюджет по инфраструктуре?	Зачем: от масштаба зависят архитектура хранения и стоимость AI-обработки Риск: недооценку нагрузки и переполнение бюджета на LLM/OCR
3	Пользователи	Каким источникам готовы дать доступ (Gmail/IMAP, загрузка файлов, выпуски)? Что вызывает недоверие?	Зачем: определяет охват автоматизации и барьеры подключения Риск: низкую конверсию из-за страха за доступ к почте
4	Пользователи	Как сейчас узнаете о списании и что считаете «слишком поздним» уведомлением?	Зачем: калибрует пороги напоминаний 7/3/0 дней под ожидания Риск: бесполезность агента, если уведомляет позже, чем нужно
5	Служба ИБ	Требования к хранению ПДн и финданных: 152-ФЗ, локализация в РФ, сроки, право на удаление?	Зачем: формирует требования к архитектуре с самого начала Риск: переделку хранилища и юридические претензии позже
6	Служба ИБ	Допустима ли отправка писем во внешние LLM или извлечение только на своём контуре?	Зачем: определяет выбор модели извлечения (внешний API vs on-premise) Риск: утечку финансовых данных, нарушение политики ИБ
7	Разработка	Есть ли готовые интеграции (почта, OCR, планировщик) или всё с нуля? Предпочтительный стек?	Зачем: уточняет объём работ и реалистичность 2-месячного пилота Риск: срыв сроков из-за недооценки интеграций
8	Разработка	Как обрабатывать неоднозначно распознанные	Зачем: задаёт баланс автоматизации и точности реестра

№	Кому	Вопрос	Зачем / какой риск закрываем
		события: авто-принятие с пометкой или ручная проверка?	Риск: ошибочные обязательства и потерю доверия к агенту
9	Заказчик / пользователи	Как измеряем метрику «не пропустить списание» (доля вовремя показанных событий)?	Зачем: даёт объективный критерий приёмки пилота Риск: спор о результате из-за отсутствия согласованной метрики

2. Ключевой бизнес-процесс: напоминание и эскалация

Выбран процесс срабатывания напоминания о предстоящем списании и эскалации при отсутствии реакции пользователя — он напрямую обслуживает критическую метрику «не пропустить списание».

Основной сценарий

- Планировщик ежедневно отбирает обязательства, у которых до списания осталось 7, 3 или 0 дней.
- Формируется напоминание с рекомендацией: при 60+ днях неактивности сервиса — «рассмотрите отмену», иначе — «подтвердите оплату/продление».
- Пользователь реагирует; система фиксирует реакцию, обновляет статус и историю уведомлений; при отмене снимает будущие напоминания.


Ветка эскалации при игнорировании

- Нет реакции на «7 дней» → на «3 дня» повторное уведомление с повышенным приоритетом.
- Нет реакции → в день списания критическое уведомление по всем каналам.
- Игнор и далее: рекуррентный платёж остаётся active с флагом «прошло без подтверждения» и попадает в отчёт о рискованных списаниях; разовый просроченный платёж переходит в expired.

Граничные случаи

- Дубли (письмо + выпуска) — дедупликация по сервису, сумме и дате в окне ± 2 дня.
- Изменение суммы — пометка «сумма изменилась», ручная проверка.
- Отключённый канал — эскалация по оставшимся; критическое уведомление за 0 дней отправляется всегда.

Схема процесса (user flow со статусами)

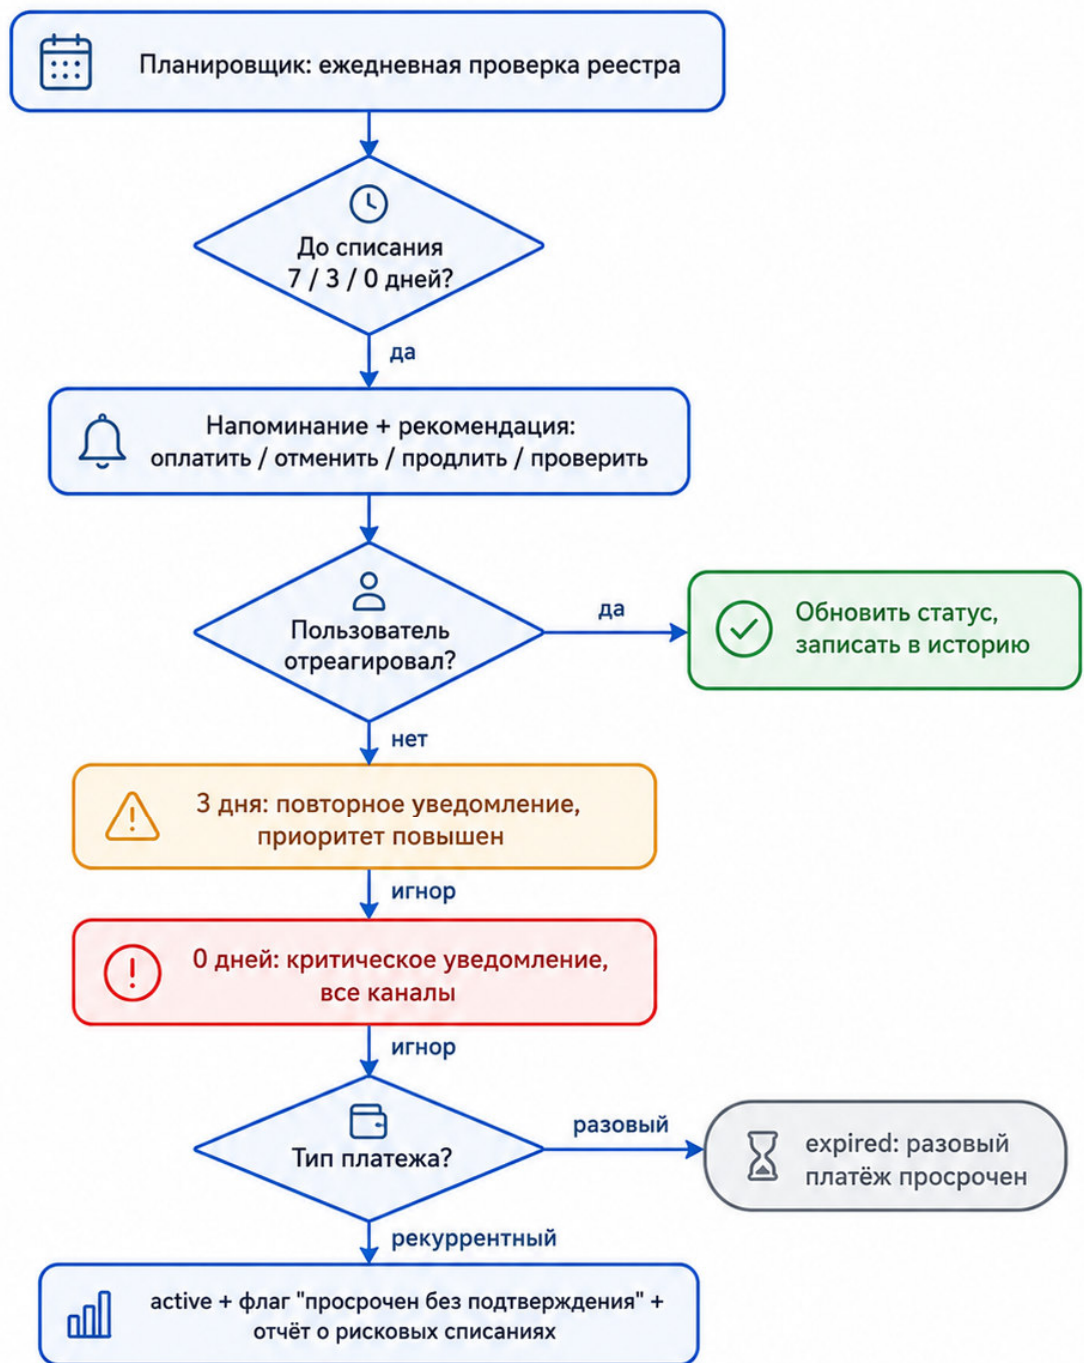

Условные обозначения:

 Процесс / действие (основной поток)

 Решение / проверка (ветвление)

 Успешное действие / завершение

  Эскалация / уведомления (предупреждение / критично)

 Терминальное состояние / статус

3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

Пилот на 8 недель, 6 вех. Для каждой — содержание, критерий готовности и роли.

Срок	Веха	Содержание · критерий готовности · роли
Нед. 1–2	Аналитика и требования	Содержание: интервью со стейкхолдерами, требования ИБ, модель данных реестра, схемы процессов Готовность: согласованы главная метрика, модель данных и требования к ПДн Роли: BA/PM, заказчик, ИБ
Нед. 2–3	Ядро реестра	Содержание: хранилище обязательств с ID, историей изменений, статусами (active/expired/cancelled) Готовность: обязательство создаётся, меняется, видна история; статусы по правилам Роли: Backend, BA
Нед. 3–4	Расчёт дат и состояния	Содержание: авторасчёт списаний с календарными особенностями, различение разовых/рекуррентных Готовность: даты без накопления ошибки; типы платежей обрабатываются верно Роли: Backend, QA
Нед. 4–6	AI-извлечение	Содержание: подключение источника, извлечение сущностей из писем/чеков, ручная корректировка Готовность: агент извлекает ≥ целевого порога сущностей; ошибки правятся вручную Роли: AI/ML, BA, ИБ
Нед. 6–7	Напоминания и эскалация	Содержание: планировщик, пороги 7/3/0, эскалация, рекомендации, отчёт о рискованных списаниях Готовность: ни одно списание не пропущено; эскалация срабатывает по сценарию Роли: Backend, BA, QA
Нед. 7–8	Интерфейс и приёмка	Содержание: календарь, список подписок, история уведомлений, фильтры; сквозной прогон Готовность: демо-сценарий проходит целиком; метрика измерена и принята Роли: Frontend, BA/PM, заказчик

Ключевые риски и предупреждение

- **Риск 1** — доступ к почте вызывает недоверие, низкая конверсия. Предупреждаем: старт с ручной загрузки и read-only доступа с прозрачным согласием; внешние LLM — только после решения ИБ, при необходимости извлечение на своём контуре.

- Риск 2 — пропуск списания (нарушение главной метрики) из-за ошибки распознавания или сбоя планировщика. Предупреждаем: дублируем критическое уведомление за 0 дней по всем каналам, ведём отчёт о рисковых списаниях, неоднозначные события помечаем для ручной проверки.

4. Процесс работы с заказчиком и командой

С заказчиком и стейкхолдерами

- Формат: демо работающего инкремента + ревью метрик и приоритетов бэклога.
- Частота: раз в 2 недели, плюс письменный статус раз в неделю.
- Фокус: ценность и прогресс к метрике «не пропустить списание»; решения по спорным требованиям; риски, требующие решения заказчика.

С командой разработки

- Формат: ежедневный синк (15 мин) + планирование и ретро на границе спринта.
- Частота: ежедневно — синк; еженедельно — планирование/грумминг; раз в 2 недели — ретро.
- Фокус: блокеры, уточнение требований и граничных случаев, готовность вехи по чек-листу критериев.

Принципы коммуникации

- Одно сообщение — одна цель: статус заказчику в терминах ценности, а не задач трекера.
- Решения фиксируются письменно (кто, что, к какому сроку).
- Плохие новости — рано и с вариантом решения.
- Требования ИБ и работа с ПДн — отдельный трек с самого начала.

5. Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект

Я студент Школы 21 и учусь через практику: беру реальные задачи и довожу их до работающего результата. Проект привлекает тем, что в нём видна вся цепочка бизнес-аналитика — от разговора со стейкхолдерами и формулировки требований до логики состояний, схемы процесса и измеримой метрики. Здесь нельзя спрятаться за общими словами: критерий «агент не должен пропускать списание» либо выполняется, либо нет, и это дисциплинирует мышление.

Мне близка сама предметная область — наведение порядка в разрозненных данных и превращение их в единый реестр с понятными правилами. Это то, чем я занимаюсь в учебных проектах: раскладываю хаос на сущности, статусы и переходы. Задача про подписки — компактный, но честный пример такой системы, где важны и аккуратная модель данных, и работа с граничными случаями (конец месяца, високосный год, дубли, изменение суммы).

Мне интересно работать на стыке ролей ВА и РМ: не только описать, как должно быть, но и спланировать, как команда придёт к результату за ограниченное время. В Школе 21 я привык к командной работе и взаимному ревью, поэтому формат «заказчик — аналитик — команда» для меня естественная среда.

Сколько времени готов уделять

Готов уделять проекту стабильно и предсказуемо, совмещая с обучением: полноценно участвовать в созвонах, аналитике и планировании, брать задачи с чётким сроком и держать заявленный темп. Формат и объём загрузки готов обсудить и зафиксировать на старте, чтобы обязательства были реалистичными и выполнялись.

Заключение

В работе представлено комплексное бизнес-аналитическое и управленческое решение по созданию платформы управления подписками и регулярными платежами. Проект рассмотрен целостно — от снятия неопределённости в требованиях до плана двухмесячного пилота с измеримыми критериями приёмки.

Сформулированные вопросы к стейкхолдерам образуют не разрозненный опросник, а логическую систему: они последовательно закрывают риски проекта от стратегического уровня (неверно выбранная цель и низкое доверие к доступу к почте) до операционного (пропуск предстоящего списания из-за ошибки распознавания или сбоя планировщика). Описанный ключевой бизнес-процесс переводит эти требования в конкретную логику работы агента с напоминаниями по порогам 7/3/0 дней и ветвью эскалации, а дорожная карта распределяет реализацию по шести вехам с ролями, критериями готовности и рисками. Раздел о работе с заказчиком и командой замыкает картину, определяя, как проект будет управляться на протяжении пилота.

Через все разделы проходит единый принцип — приоритет главной метрики: агент не должен пропускать предстоящие списания. Именно она задаёт политику поведения системы в спорных ситуациях: критическое уведомление за день до списания отправляется по всем доступным каналам, неоднозначные события помечаются для ручной проверки, а рискованные списания фиксируются в отдельном отчёте, а не проходят молча.

Предложенный подход обеспечивает баланс автоматизации и контроля: система берёт на себя сбор данных, ведение реестра и своевременные напоминания, но финальное решение — оплатить, отменить или продлить — остаётся за пользователем. Ожидаемый эффект — превращение разрозненного и непрозрачного процесса в единый управляемый реестр обязательств с понятными правилами и своевременными уведомлениями.

Таким образом, качество бизнес-анализа на этапе постановки задачи напрямую определяет, будет ли построенная платформа решать реальную проблему пользователя или лишь имитировать её решение. Проработанные требования, процесс, план и метрики формируют основу, на которой такой продукт может быть создан осознанно и с предсказуемым результатом.

Список источников

1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). Version 3. — International Institute of Business Analysis (IIBA), 2015.
2. Визерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; БХВ-Петербург, 2014.
3. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. — М.: Лори, 2011.
4. Cadle J., Paul D., Turner P. Business Analysis Techniques: 99 Essential Tools for Success. — BCS, 2014.
5. ГОСТ Р 57193–2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. — М.: Стандартинформ, 2016.
